Currency Intelligence 作業報告 2 — IMPLEMENTATION SPEC 02 対応

対象: 2026-10-28 07:10 〜 07:45 UTC / ブランチ: `akihair61/ciel-site` の `currency-intelligence`(main・Pages・ドメインには触れていない)/ コミット `a338f00`(push 済み)/ アーティファクト第 10 版・第 11 版

6 / 6	36 / 36	28 / 28	0
Q-01〜Q-06 修正・試験済み	自動テスト(既存 29 の期待値は不変)	ブラウザ自動確認(Playwright)	本番有効な機能(配信先未決)

報告の約束(SPEC 02 §報告ルール):「作成」= 書いた、「ビルド」= この環境で tsc / esbuild が通った、「試験」= `node --test` か Playwright で確認した、「本番有効」= 利用者が実際に使える配信。**本番有効なものは現時点でひとつもない。**Claude アーティファクトは外部 API に届かないデモ(同梱サンプルレート)であり、独立リポジトリと GitHub Pages はオーナーの操作待ち。

1. 何をしたか(SPEC 02 の順序どおり)

フェーズ	内容	作成	ビルド	試験	本番有効
Phase 0 現物監査	`docs/BASELINE.md`: 監査時 HEAD `9459285`、Node v22.22.0、tsc 6.0.2、29/29 テスト、依存ゼロ、外部 API 到達不可を実測記録。Q-01〜Q-06 の所在(ファイル・行)を特定	✅	—	—	—
Phase 0 分離計画	`docs/MIGRATION_PLAN.md`: private リポジトリ既定、subtree split、Pages は base path 確認後にオーナーが有効化、オリジン変更時は Export/Import、v3→v4 のスキーマ移行表。**実行は未**(このセッションからのリポジトリ作成は GitHub API 403)	✅	—	—	未実行
Phase 0 ADR	`docs/adr/0003-spec02-conflicts.md`: Reduce Motion、「Live」表現、シミュレーション vs 実記録、REDUCED フラグ、数値精度、同梱値の呼称の 6 点について、何を捨て何を残したかを記録	✅	—	—	—
Phase 1 Q-01	数値を double に通さない JSON パーサ `packages/core/src/json.ts`(サイズ 2MB・深さ 64・`__proto__` 無害化)。全プロバイダが `res.text()` → パーサ。24 桁のレートが欠損なく通ることをテスト	✅	✅	✅ 4+1 件	—


Phase 1 Q-02	`RateQuote.observedAt` を `string | null` に。Coinbase は null、`staleness()` は `basis` を返し、`cross()` は片脚不明なら estimated。UI:「Coinbase · fetched Ns ago · observation time not published」「ECB reference · daily」「Sample rate · not current」。「Live」の語を全廃、レート詳細に Freshness 行	✅	✅	✅	—
Phase 1 Q-03	OS の Reduce Motion を既定で尊重(`motion: auto`)。設定シートで On / Off。reduced 時は全アニメーション 1ms、スプラッシュ・変換ローディング・印字の待ちをスキップ。Playwright の `reducedMotion: "reduce"` でホーム表示 107ms、結果シート 283ms を確認	✅	✅	✅	—
Phase 1 Q-04	Convert = **シミュレーション**(残高・台帳に触れない、参照 `SIM-`)。結果シートに「Simulation · no balance changed, no money moved」タグと「Record as a real exchange」。確認ダイアログ後、2 脚と残高を 1 回の保存で書く(`EXC-`)。既存の変換は `legacy_convert` / `legacy:true` として保持し「Made before v4」と表示。ホーム・カードに「手動で記録した現金であり金融口座残高ではない」。レシートは SIMULATION NOTE / EXCHANGE RECORD / LEGACY CONVERSION	✅	✅	✅	—
Phase 1 Q-05	`settle()` の説明とレシート/割り勘 UI を「精算回数を減らす提案(最少とは限らない)」に。不変条件テスト追加(転送数 ≤ 債務者+債権者−1、収支ゼロ、決定的)	✅	✅	✅	—
Phase 1 Q-06	localStorage `ci.v4`(`schemaVersion: 4`)。保存前に直前値を `ci.v4.bak` に退避。v3 → v4 移行(`ci.v3` は削除しない)、読み取り不能時はバックアップから復旧。Export JSON(封筒 + 版数)/ Import JSON(スキーマ検証・件数提示・確認後に置換)。アーティファクト内では viewer の保存確認を使う	✅	✅	✅	—
Phase 2A F13	ホーム MORE →「Split a bill」: 人数(最大 20)、均等 / 重み、支払者、各人の分担(丸め差の割当表示)、精算提案、共有テキスト、支払者の支出として記録へ連携。残高・台帳は変更しない	✅	✅	✅ ブラウザ	—
Phase 2 残り	F11 旅行・予算(記録時レートのスナップショット)、F01 ピン留め・ja/en/th、F02 始値/終値の定義、F03 12 通貨一覧	未	—	—	—
Phase 3 iOS	SwiftUI / Widget。macOS + Xcode が必要(B-01)	未	未	未	—

2. 検証の実態(何で確かめ、何は確かめていないか)


確認したこと	方法	結果

計算エンジン	`npm run typecheck`、`node --test test/*.test.ts` (Node 22.22、依存ゼロ)	**36 / 36 通過**
v3 データの移行	Playwright: `ci.v3` を仕込み再読込 → `ci.v4` 生成、履歴 legacy 化、残高保持、`ci.v3` 無変更	**7 項目通過**
シミュレーション / 実記録	変換後に残高・台帳が不変、履歴 `SIM-`。Record 後に JPY −500、THB +換算額、台帳 `EXC-`、バックアップに変更前状態	**11 項目通過**
Export / Import	ダウンロード内容の検証、不正ファイル(残高が数値)拒否、新しい版数拒否、正常ファイルの置換	**4 項目通過**
Reduce Motion	Playwright `reducedMotion: "reduce"` と設定 On の上書き	**3 項目通過**
参照フローの録画	`record.js` (起動 → ホーム → カード → 現金追加 → 変換 → レシート)。ページエラーなし	**24 フレーム + webm**
外部レート API の実疎通	この環境から api.coinbase.com / open.er-api.com / api.frankfurter.app は proxy 403	**未確認(テストのフェイク応答のみ)**
ダークモード、VoiceOver、実機 iOS	—	**未確認**


3. 画面(変更後)

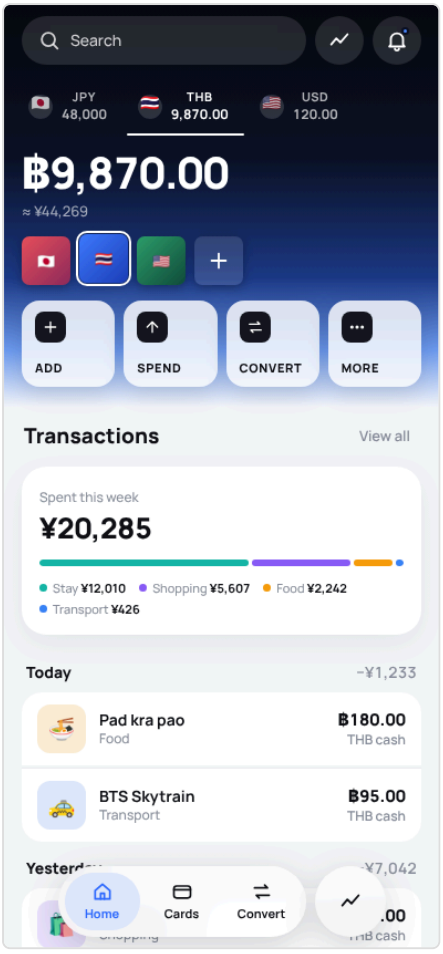


ホーム。「手動で記録した現金」の注記を一覧の下に追加

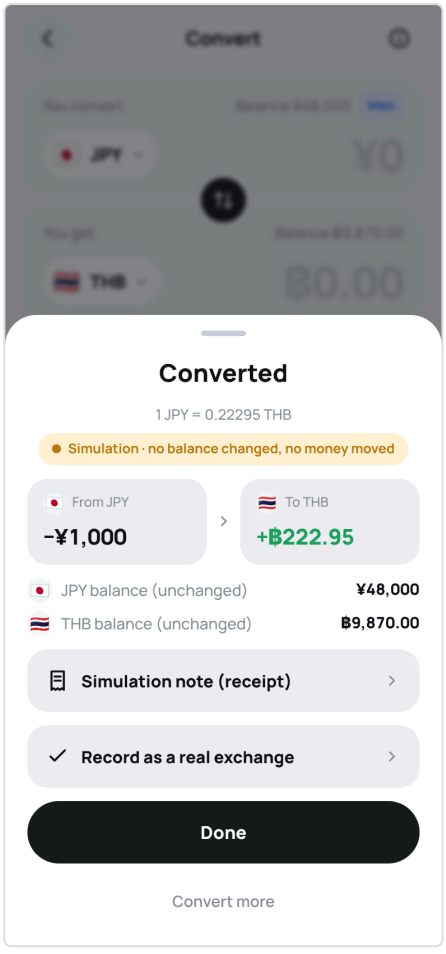


変換結果 = シミュレーション。残高不変のタグと「Record as a real exchange」

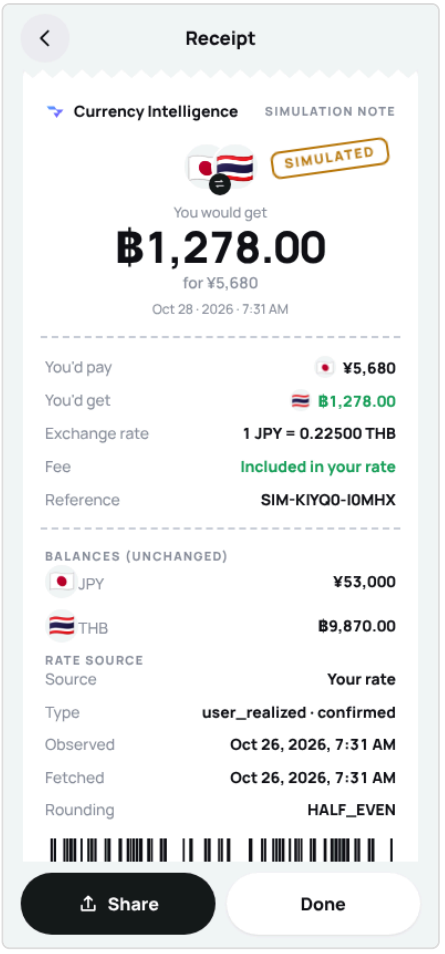


シミュレーション控え(SIMULATED、BALANCES UNCHANGED)

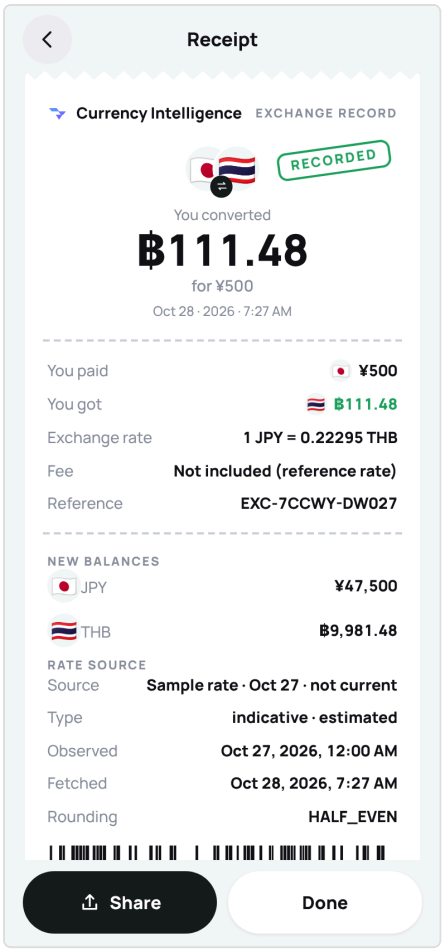

実両替記録(RECORDED、NEW BALANCES、EXC- 参照)

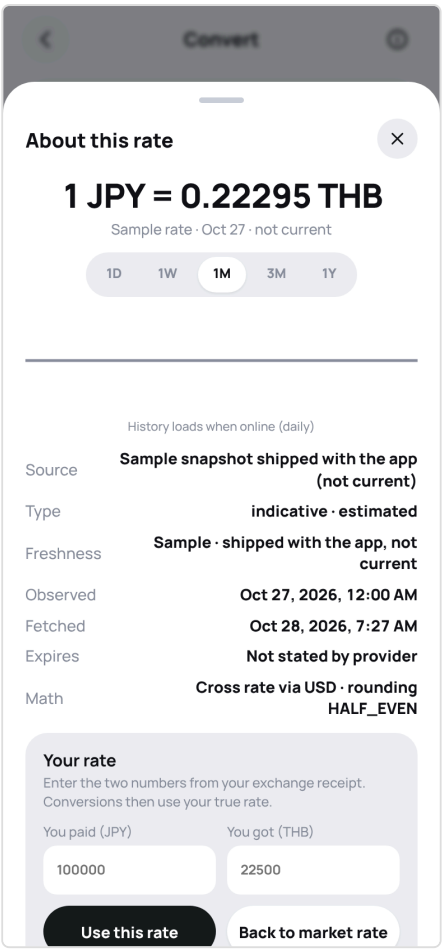

レート詳細: Sample 表示、Freshness 行、観測/取得時刻

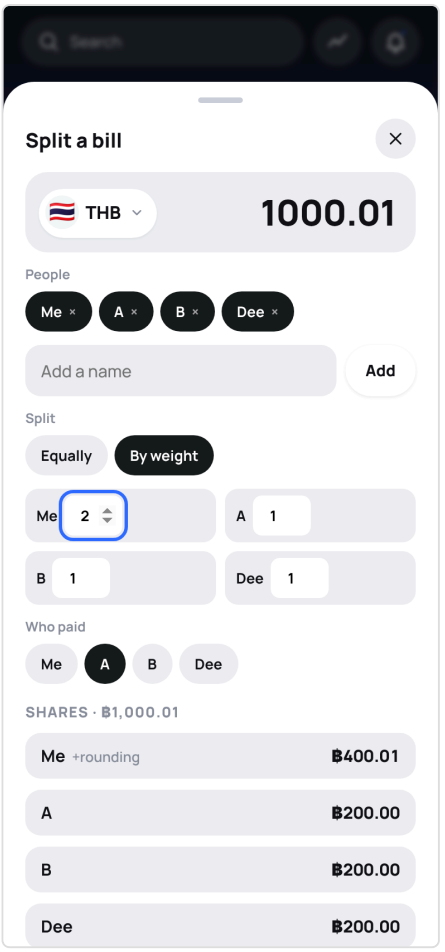

割り勘(F13): 重み付き、丸め差の割当、精算提案

4. 変更したファイル

ファイル	変更
`packages/core/src/json.ts` (新規)、`test/json.test.ts` (新規)	数値保持 JSON パーサ + 4 テスト
`packages/core/src/providers.ts`	`FetchLike` が `text()`、`readJson()`、Coinbase `observedAt: null`
`packages/core/src/rates.ts`, `convert.ts`, `split.ts`, `index.ts`	observedAt null 対応(`staleness.basis`, `quoteTimeMs`)、`receivedAt` を結果に追加、settle の説明、json エクスポート
`packages/core/test/*.test.ts`	フェイク fetch を `text()` に。精度・null・settle 不変条件の 3 テスト追加。既存の期待値は変更なし
`apps/web/app.js`, `index.html`, `styles.css`, `sw.js`	ストレージ v4、motion、文言、シミュレーション/記録、More メニュー、Split シート、設定(Motion / Export / Import)、SW v5
`docs/BASELINE.md`, `MIGRATION_PLAN.md`, `adr/0003`, `FEATURE_MATRIX.md`, `BLOCKERS.md`, `README.md`, `DEPLOY.md`, `TECH_VALIDATION.md`	Phase 0 文書、作成/ビルド/試験/本番有効の列、SPEC 02 対応表、private 既定

`docs/screenshots/spec02/`, `docs/verify_p1.js`, `docs/record.js`	回帰基準の画面・動画と、再現用スクリプト

5. 残っている判断(オーナー)

- **独立リポジトリ**: GitHub で private の `currency-intelligence` を作成し、このセッションの GitHub 連携に追加する。以後の手順は `docs/MIGRATION_PLAN.md`。
- **配信先**: Pages(private で使えるかはプラン次第)か別ホスティングか。`ciel-site` のドメイン配下は指示がない限り使わない。
- **外部 API の許可**: この環境のネットワーク許可に `api.coinbase.com`, `open.er-api.com`, `api.frankfurter.app` を加えると、プロバイダを実応答で検証できる。
- **見た目の変更の可否**: 結果シートのタグ+ボタン追加、レシートの見出し語は参照動画と異なる(ADR-0003)。

やっていないこと(正直に): Phase 2 の F11 旅行予算スナップショット・F01 ピン留め/多言語・F02/F03、Phase 3 iOS、リポジトリ分離の実行、外部 API の実疎通、ダークモードと実機の目視。これらを「済み」とは書いていない。
